



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 83

della Giunta comunale

**OGGETTO:      LAVORI DI SOTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO  
LUNGO UNA LATERALE DI VIA NAZIONALE; LIQUIDAZIONE  
SALDO LAVORI.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **quattro** del mese di **luglio**, alle ore 17.30, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Nicolao dott. Giovanni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sono in corso di esecuzione i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del centro storico del comune di Imer, i quali interessano più vie pubbliche fra le quali è compresa anche via Nazionale ed una sua parallela nei pressi del bivio con la strada provinciale del passo Gobbera;

Dato atto che su tale diramazione della via principale, durante l'esecuzione di uno scavo per la posa di una tubazione privata, è stato riscontrato che il ramo di acquedotto comunale ivi interrato era fortemente deteriorato per cui nemmeno ipotizzabile di mantenerlo seppellito sotto la nuova pavimentazione che di lì a pochi giorni sarebbe stata posata;

Con l'occasione della sostituzione della vecchia tubazione, è stata anche prospettata la revisione ed il rifacimento degli allacciamenti privati, anch'essi datati e con costi a carico delle proprietà interessate, i cui proprietari hanno integralmente aderito alla proposta; per fare ciò è stato necessario predisporre un nuovo pozzetto con relativo collettore dal quale sarebbero dovute partire le nuove utenze private di acquedotto; tale ultimo intervento, sarebbe stato a carico del comune di Imer;

Considerato che gli interventi prospettati, sono stati valutati dall'assessore competente quali urgenti e inderogabili al fine di evitare che il cantiere principale subisse interruzioni causate dal tempo necessario a preventivare ed autorizzare l'intervento, per cui è stato deciso di procedere senza indugio, rimandando a lavoro ultimato la liquidazione della spesa sostenuta, avendo comunque già verificato preliminarmente la disponibilità di bilancio;

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile ad impedire la sospensione dei lavori principali e sono stati completati a regola d'arte;

Visto ora il resoconto finale con il quale la ditta Ediltomas snc, di Primiero SMC, esecutrice dei lavori oggetto del presente provvedimento, quantifica in € 4'203,09 il costo complessivo dei lavori affidati;

ritenuto potersi procedere con la liquidazione del corrispettivo spettante;

vista la disponibilità di bilancio 2018 al capitolo 10052138 – art. 2 – cod. 2020109012;

Accertato altresì che l'importo dei lavori da affidare risulta singolarmente inferiore ad € 50'000,00 e che, pertanto, risulta possibile assegnare i medesimi a trattativa diretta in applicazione dell'art. 52 comma 9 della L.P. 10 settembre 1993 n.26, che consente l'affidamento diretto alla Ditta che si ritiene idonea per "contratti di importo non superiore ad euro 50.000,00";

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione T.A.A. approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005, n° 4/L;

visto il T.U.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.2.2005, n. 3/L;

Acquisito il parere favorevole, del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 16 – 6^ comma della L.R. 23.10.1998 n. 10, nonché in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria dell'atto ai sensi dell'art. 16 – 6^ comma della L.R. 23.10.98 n. 10 , relativamente alle sue competenze visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che a seguito della necessità urgente ed inderogabile ed in contemporanea con i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di alcune vie del centro storico di Imer, sono stati realizzati dalla ditta Ediltomas snc con sede in vi Cismon, 6 a Primiero SMC (Tn) i lavori di sostituzione di un tratto di tubazione dell'acquedotto comunale deteriorato lungo una parallela di via Nazionale, nonché la predisposizione di un pozzetto con relativo collettore per gli allacciamenti privati alla rete idrica comunale, oltre che ad ulteriori opere minori a completamento degli interventi sopra indicati;
- 2) Di dare ulteriormente atto che i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, sono stati rendicontati dalla ditta esecutrice in netti € 4'203,09 (lordi iva compresa € 5'127,77) come risultante dal consuntivo finale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di liquidare pertanto alla ditta Ediltomas snc, a saldo dei lavori di cui al presente provvedimento, l'importo netto di € 4'203,09 (lordi iva compresa € 5'127,77) previa presentazione di idonea documentazione fiscale;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di cui al presente provvedimento e pari ad € 5'127,77, al capitolo 10052138 art. 2 cod. 2020109012 del bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 5 e 27 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 37 di data 22/12/2000;


Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nicolao dott. Giovanni

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

Impresa EDILTOMAS snc via Cismon n° 6 38050 SIROR (Tn) tel & fax 0439 762386

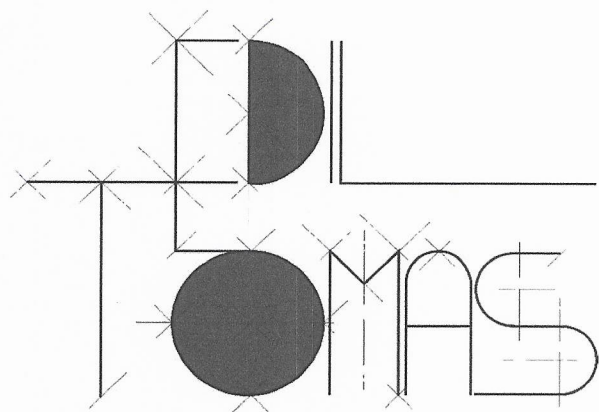

## LISTA ECONOMIE N° 1 del 25-5-2018

LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO, POZZETTI E FOGNATURE VARIE

Cliente: COMUNE DI IMER - geom. FRANCO TOMAS

Data	Descrizione	n°	Lungh.	Largh.	H/peso	U.m.	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
18/04/18	Lavoro eseguito in economia diretta per scavo per ricerca acquedotti, posa pozzetto, copertina e chiusino ghisa								
	prolunga prefabbricata da 100x100x100	1,00				cad	1,00	€ 99,00	€ 99,00
	prolunga prefabbricata da 100x100x30	1,00				cad	1,00	€ 49,00	€ 49,00
	soletta prefabbricata da 120x120x20	1,00				cad	1,00	€ 125,00	€ 125,00
	chiusino in ghisa tondo d400	1,00				cad	1,00	€ 110,00	€ 110,00
	A.02.05.0030.010 escavatore potenza fino a 60 kW h 63,45	8,00				ora	8,00	€ 63,45	€ 507,60
	A.01.05.0010.005 operaio specializzato h 36,97	8,00				ora	8,00	€ 36,97	€ 295,76
19/04/18	Lavoro eseguito in economia diretta per formazione tratto di condotta di scarico								
	carotaggio diametro mm 180	1,00				cad	1,00	€ 120,00	€ 120,00
	tubo in pvc sn 4 diametro mm 125	1,00				m	1,00	€ 3,80	€ 3,80
	riduzione in pvc sn 4 diametro mm 125-160	1,00				cad	1,00	€ 6,50	€ 6,50
	riduzione in pvc sn 4 diametro mm 200-160	1,00				cad	1,00	€ 7,50	€ 7,50
	curva in pvc sn 4 diametro mm 125 a 45°	1,00				cad	1,00	€ 3,90	€ 3,90
	sifone in pvc sn 4 diametro mm 125	1,00				cad	1,00	€ 20,00	€ 20,00
	A.02.05.0030.010 escavatore potenza fino a 60 kW h 63,45	2,00				ora	2,00	€ 63,45	€ 126,90
	A.01.05.0010.005 operaio specializzato h 36,97	14,00				ora	14,00	€ 36,97	€ 517,58
20/04/18	Lavoro eseguito in economia diretta per posa canaletta, materiale riciclato, cemento, riparazione griglia esistente, scavo e demolizione con escavatore								
	canaletta pircher 150 h 25,5	1,00	3,00			m	3,00	€ 45,50	€ 136,50
	materiale pietrisco riciclato franco cantiere	3,00	8,64			ton	25,92	€ 8,00	€ 207,36
	calcestruzzo confezionato in cantiere	1,00	1,00			mc	1,00	€ 100,00	€ 100,00
	A.02.05.0030.010 escavatore potenza fino a 60 kW h 63,45	1,00	3,00			ora	3,00	€ 63,45	€ 190,35
	A.02.05.0050.020 sovrapprezzo martellone peso 80-110 kg h 9,64	1,00	2,00			ora	2,00	€ 9,64	€ 19,28

10052138 Ad. 2

	A.02.05.0050.020 martello demolitore elettrico peso oltre 6 kg h 3,70	1,00	3,00			ora	3,00	€ 3,70	€ 11,10
	A.01.05.0010.005 operaio specializzato h 36,97		20,00			ora	20,00	€ 36,97	€ 739,40
21/04/18	Lavoro eseguito in economia diretta per ricopertura scavo e compattazione								
	A.02.05.0030.010 escavatore potenza fino a 60 kW h 63,45	1,00	5,00			ora	5,00	€ 63,45	€ 317,25
	A.01.05.0010.005 operaio specializzato h 36,97		1,00			ora	1,00	€ 36,97	€ 36,97
	A.02.25.0040.010 rullo del peso fino a t 10 con motore da KW 50		2,00			ora	2,00	€ 61,61	€ 123,22
	A.02.25.0120.010 costipatore vibrante combinato del peso fino a 5 t.		2,00			ora	2,00	€ 45,62	€ 91,24
23/04/18	Lavoro eseguito in economia diretta per taglio e sistemazione canaletta								
	A.01.05.0010.005 operaio specializzato h 36,97		4,00			ora	4,00	€ 36,97	€ 147,88
	angolare in ferro e grigliato		1,00			corpo	1,00	€ 90,00	€ 90,00

**TOTALE LAVORI PER COMUNE IMER i.v.a. esclusa**

**€ 4.203,09**

Primiero S.M.C., 25-5-2018

L'Impresa

**EDILTOMAS s.n.c.**  
 via Cismori n° 6/Bior 38054  
 Primiero San Martino di Castrozza (TN)  
 c.f. & p.iva 04059480222  
 tel & fax 0439 762386  
 ediltomas@pec.trovarti.it ediltomas@libero.it
